


				Relatório n°	53
				Data do relatório	29/04/2025
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS			Prazo contratual	415 dias
Local	Rua Verador Joaquim Anotnio Chaves, Rua Candido Gonçlaves dos reis esquina com Rua Davi Chavier de Alcântra			Prazo decorrido	79 dias
Contratante	PREFEITURA DE PAPAGAIOS	Responsável	YARLLEI SILVA DIAS	Prazo a vencer	336 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (19)						
Mestre de Obra 1	Pedreiro 7	Servente 9				Mão de Obra Direta (17)
Armador 2						Terceiros (2)

Atividades (7)	
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.002 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO <i>Escavação das sapatas</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.004.001 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO <i>Assentamento tijolo cerâmico</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.006 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR <i>Corte e Montagem de aço das vigas respaldo e pilares</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.009 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) <i>Concretagem dos Pilares e vigas respaldo</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.010 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO <i>Forma dos arranques de pilares e pilares, vigas baldrame e respaldo</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.004 - LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL <i>Lastro de brita das vigas baldrame</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.004.002 - CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO <i>Chapisco das paredes</i>	Não iniciada

Fotos (11)

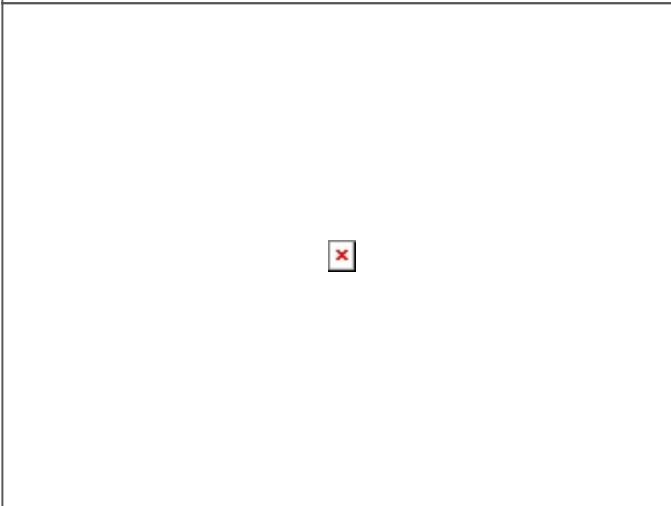





Assinatura

Assinatura
