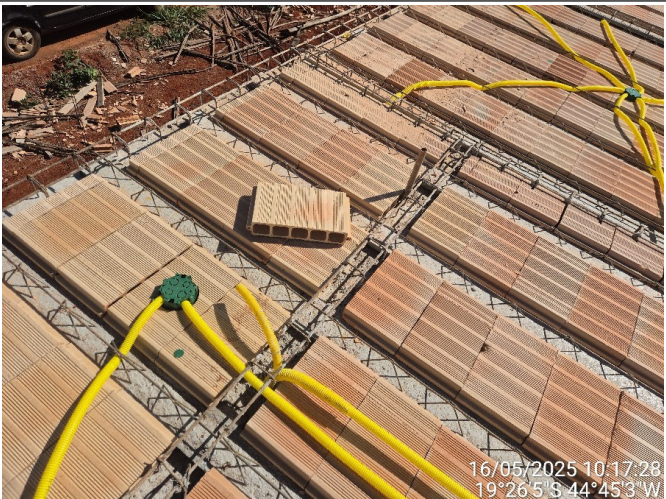


				Relatório nº	66
				Data do relatório	16/05/2025
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS			Prazo contratual	415 dias
Local	Rua Verador Joaquim Anotnio Chaves, Rua Candido Gonçlaves dos reis esquina com Rua Davi Chavier de Alcântra			Prazo decorrido	96 dias
Contratante	PREFEITURA DE PAPAGAIOS	Responsável	YARLLEI SILVA DIAS	Prazo a vencer	319 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (19)						
Mestre de Obra 1	Pedreiro 7	Servente 9				Mão de Obra Direta (17)
Armador 2						Terceiros (2)

Atividades (6)	
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.004.001 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO <i>Assentamento tijolo cerâmico</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.006 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR <i>Corte e Montagem de aço das sapatas, arranques pilares</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.009 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) <i>Concretagem dos Pilares</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.010 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO <i>Forma dos pilares</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.011 - LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIV <i>Montagem da laje pré moldada</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.006.004 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO <i>Passagem dos eletrodutos (elétrica) e colocação das caixas de teto</i>	Não iniciada

Fotos (16)	
 16/05/2025 10:17:39 19°26'5"S 44°45'3"W	 16/05/2025 10:17:28 19°26'5"S 44°45'3"W







Assinatura

Assinatura
